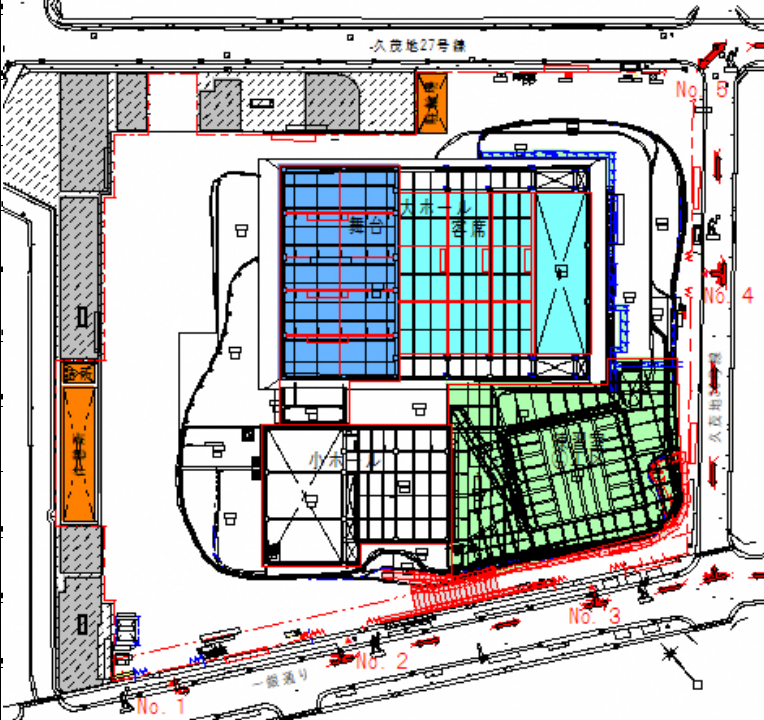


2021年 2月 ~ 2021年 4月 3カ月工程表

工事名	那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)		施工者	國場組・大米建設・金城キョ建設・ニシダ工業 共同企業体		工期	自 2018年10月4日																																																																																				
							至 2021年5月31日																																																																																				
月	2月																												3月																												4月																																		
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
書類・施工図作成	平面詳細図・金物製作図修正																												竣工図、竣工書類作成																												竣工図、竣工書類作成																																		
立会検査	内外装工事関係検査																												内外装工事関係検査																												内外装工事関係検査																																		
竣工検査																																																									JV自主検査 ⇒ 社内検査 ⇒ 監理・監督員検査																																		
共通仮設工事	大乗入れ構台撤去																												小乗入れ構台撤去																																																														
直接仮設工事	内外装工事に合わせて足場解体、盛替え																												内装工事に合わせて足場解体																												~ 4/3予定																																		
コンクリート工事	搬入口土間コン																												1階スラブコン																																																														
鉄骨工事(建方・本締め)	ウナー天井下地、各所階段取付、大ホール吊材手直し、プロセニウム建方																																																																																										
鉄骨工事(耐火被覆・塗装)	+ 練習室2 2~4階 防火塗料																																																																																										
金属工事(HPC工事)																																																																																											
既製コンクリート工事																													大練習室2 2階外部花ブロック積み																												大練習室2 1階外部花ブロック積み ~4/17予定																																		
防水工事																													各階ウレタン防水																												~ 3/20予定																																		
屋根及びびとい工事																																																																																											
金属工事	大練習室1~4階 軽鉄壁・天井下地組																												各所照明BOX取付、金物、手摺取付																												~ 3/31予定																																		
左官工事	大ホール段床、各階床補修																																																								大ホール段床、各階床補修~4/10予定																																		
石工事	便所カウンター取付																																																								~ 3/31予定																																		
タイル工事	大ホール客席壁タイル貼り																																																								ウナー床タイル貼り ~ 4/24予定																																		
木工事	付合板貼り・大ホール反射板仕上げ、楽屋廻り造作工事、大小ホール客席・舞台ワゴン床下地組、各所練付合板貼り																																																								各所練付合板貼り ~ 5/15予定																																		
金属製建具工事	各所ドア吊込み、調整																																																								金物、鍵取付 調整 ~ 5/15予定																																		
ガラス工事	大練習室1~3階 階段、吹抜け廻りガラス取付、シール打																												~ 3/27予定																																																														
塗装工事	※3月度も揚重機作業、生コン打設作業に伴い、騒音・振動が発生致します。ご協力お願い致します。																												大ホール客席、大練習室 1~4階 内部壁・天井塗装																												大練習室1~4階 内部壁塗装 樞、笠木、見切り塗装 ~ 5/15予定																																		
内外装工事	※3月度も、工程の遅れにより日曜日を作業を行う予定です。基本的には、内装仕上工事ですので、大型車両の出入りや騒音の出る作業は行いません。																												大練習室1~4階壁・天井ボード張り、GWB貼り フローリング貼り、タイルカーペット貼り																												フローリング貼り、タイルカーペット貼り、サイン工事 ~ 5/15予定																																		
ユニット及びその他工事	何かとご不便・ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、細心の注意を払いながら作業を進めて参りますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。																												大ホール反射板仕上げ、大練習室浮き構造工事、化粧台、カウンター、小ホール移動式観覧席組立																												大ホール客席取付、ミニキッチン、カウンター、化粧台、管理扉取付 ~ 5/15予定																																		
昇降機設備工事																													3/12受電後調整 ⇒ 主事検査																																																														
外構工事	何かお気付きの点がございましたら下記までご連絡くださいますようお願い致します。																												外構工事(CB撤去工事、擁壁工事、排水工事、囲障工事)																												外構工事(擁壁工事、排水工事、囲障工事、植栽工事、舗装工事) ~ 5/15予定																																		
重機・はつり・振動作業	日曜作業日：令和3年3月7日、14日、21日、28日 作業時間：AM 9:00 ~ PM 5:00頃まで																												8:00~18:00 コンクリート整形時のはつり・振動作業、掘削作業																																																														
資材搬入・残土搬出(トレーラー・10tトラック)	お問い合わせ：那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築) 國場組・大米建設・金城キョ建設・ニシダ工業 共同企業体 ☎：098-917-0170																												8:00~18:00 搬入トレーラーの出入りはNo.1,2,3,4,5ゲート使用																																																														
生コン打設(ミキサー車)																													8:00~18:00 ミキサー車の出入りはNo.1,2,3,5ゲート使用																																																														
