


2019年 5月 ~ 7月 3カ月工程表

工事名	那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)	施工者	國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業 共同企業体		工期	自 2018年10月4日		5月迄の累計予定出来高	6月の予定出来高	累計予定出来高
						至 2021年3月23日		5月迄の累計実施出来高	6月の実施出来高	累計実施出来高

月	5月																															6月																															7月																														
	日付																															日付																															日付																														
	曜日																															曜日																															曜日																														
共通仮設工事											鉄骨、防水工事施工計画書・製作要領書・展開図・3階躯体図作成										鉄骨、防水工事施工計画書・製作要領書・展開図・4、5階躯体図作成										鉄骨、防水工事施工計画書・製作要領書・展開図・6、R階躯体図作成																																																														
立会検査											床付、配筋、生コン受入検査										床付、配筋、生コン受入検査										床付、配筋、生コン受入検査																																																														
直接仮設工事											躯体工事に合わせて足場組立										躯体工事に合わせて足場組										躯体工事に合わせて足場組																																																														
磁気探査											経層・簡易探査										経層・簡易探査										経層・簡易探査完了予定日 7/6																																																														
作業構台工事	腹起し・斜梁取付										仮設構台設置										腹起し・斜梁取付										仮設構台設置										仮設構台設置完了予定日 7/13																																																				
杭地業工事																					掘削工事に合わせて杭頭処理										杭頭処理完了予定日 7/13																																																														
掘削工事											二次掘削										1階基礎地中梁掘削										掘削・床付工事完了予定 7/20																																																														
鉄筋工事											B2階基礎配筋										B2階地中梁配筋										B2階柱壁配筋										1階基礎・地中梁配筋																																																				
型枠工事											B2階基礎型枠										B2階地中梁型枠										B2階柱壁型枠										1階基礎・地中梁型枠																																																				
コンクリート工事											1工区底板										2工区底板										1工区地梁					2工区地梁					1工区B2階スラブ					2工区B2階スラブ					1工区B2階躯体					2工区B2階躯体					3工区B2階躯体					4工区B2階躯体																											

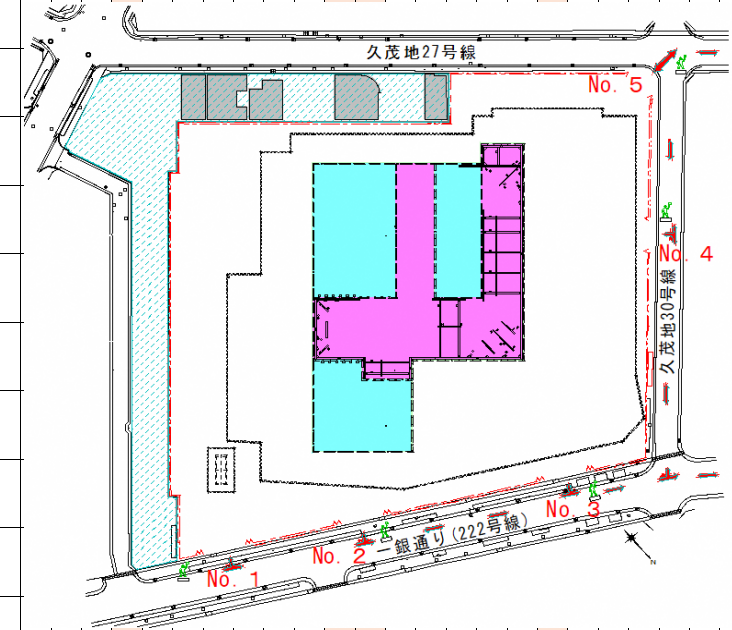

※6月度も重機作業、生コン打設作業に伴い、騒音・振動が発生致します。
 ご協力お願い致します。
 お問い合わせ
 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)
 國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業 共同企業体
 ☎:098-917-0170

騒音・振動作業	8:00~18:00		掘削作業時に、石等にあたる音、はつり作業																														
重機搬出入作業	8:00~18:00		ミキサー車の出入りはNo.3.4.5ゲート使用※生コン打設日に関しては、工程・天候等に左右されるので、多少、前後する場合があります。																														
生コン打設 (ミキサー車)	8:00~18:00																																
残土搬出 (大型10tダンプ)	8:00~18:00		ダンプの出入りはNo.1.3.5ゲート使用																														
備考	新天皇即位 休日 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 振替休日	第23回定例会議	第24回定例会議	第25回定例会議	第26回定例会議	第27回定例会議	第28回定例会議	第29回定例会議	第30回定例会議	第31回定例会議	第32回定例会議	海の日	第33回定例会議	第34回定例会議																			
