

第18回那覇市議会報告会及び
市民との意見交換会
- 都市建設環境常任委員会 -

公園・緑地の
整備事業について

公園&緑地の役割

豊かな地域づくり

子ども達が遊び
集う場

緑地や良好な
都市景観の形成

生物多様性の確保



住民が憩う
健康増進の場

住民の交流と
レクリエーションの場

都市生活環境の改善

多様な機能を発揮する根幹的施設

那覇市の公園・緑地整備状況(那覇市管理以外も含む)

区分	種類	種別	供用開始(開園)	
			箇所	面積
基幹公園	住区基幹公園	街区公園	132	18.77
		近隣公園	19	28.29
		地区公園	4	13.21
		計	155	60.27
	都市基幹公園	総合公園	6	92.64
		運動公園	1	28.22
計		7	120.86	
特殊公園		霊園	1	3.92
緑地		都市緑地	6	3.88
		港湾緑地	6	13.55
その他		児童遊園	1	0.24
合計			176	202.72

那覇市での公園の計画面積は約 293ha (188 ヶ所)

上記の整備状況は一部開園を含め 202.72ha (176 ヶ所) で、計画全体の 69%

那覇市内の公園・緑地の種別

街区公園

公園を中心に、半径250m以内の住んでいる人たちが利用できるよう、遊戯施設、広場、休憩施設等が配置された身近な公園。

(標準面積 0.25ha 緑化面積率30%以上)

近隣公園

公園を中心に、半径500m以内の住んでいる人たちが利用できるよう、屋外レクリエーション活動や休憩スペースを十分に確保された公園。

(標準面積2ha 緑化面積率50%以上)

地区公園

公園を中心に、半径1km以内に住んでいる人たちが利用できるよう、身近なスポーツ、レクリエーション施設を主体に、休憩施設や修景施設等が配置された公園。

(標準面積4ha以上 緑化面積率50%以上) 緑ヶ丘・大石・弁ヶ岳公園

総合公園

都市に住む全体の人たちが、休憩、観賞、遊戯、運動など総合的に利用できるよう施設が配置された公園です。また、都市のシンボリックな公園。

(標準面積10～50ha 緑化面積率50%以上) 新都心・漫湖・旭ヶ丘・末吉公園

運動公園

都市住民全体が主として運動ができるよう、運動施設の敷地面積が25%以上50%以下の範囲内において、野球場、サッカー場、陸上競技場、テニスコート、体育館、プールなどの運動施設が配置された公園。

(標準面積15～75ha 緑化面積率30%以上) 奥武山公園

特殊公園

識名霊園

国営公園

首里城公園

都市緑地



主として、都市の自然環境の保全及び改善、都市景観の向上を図るための緑地。

(標準面積0.1ha以上) 天久・安里緑地

港湾緑地

港湾における環境を積極的に整備し、良好な自然環境の保全や向上等に資する緑地。

那覇市公園・緑地配置図

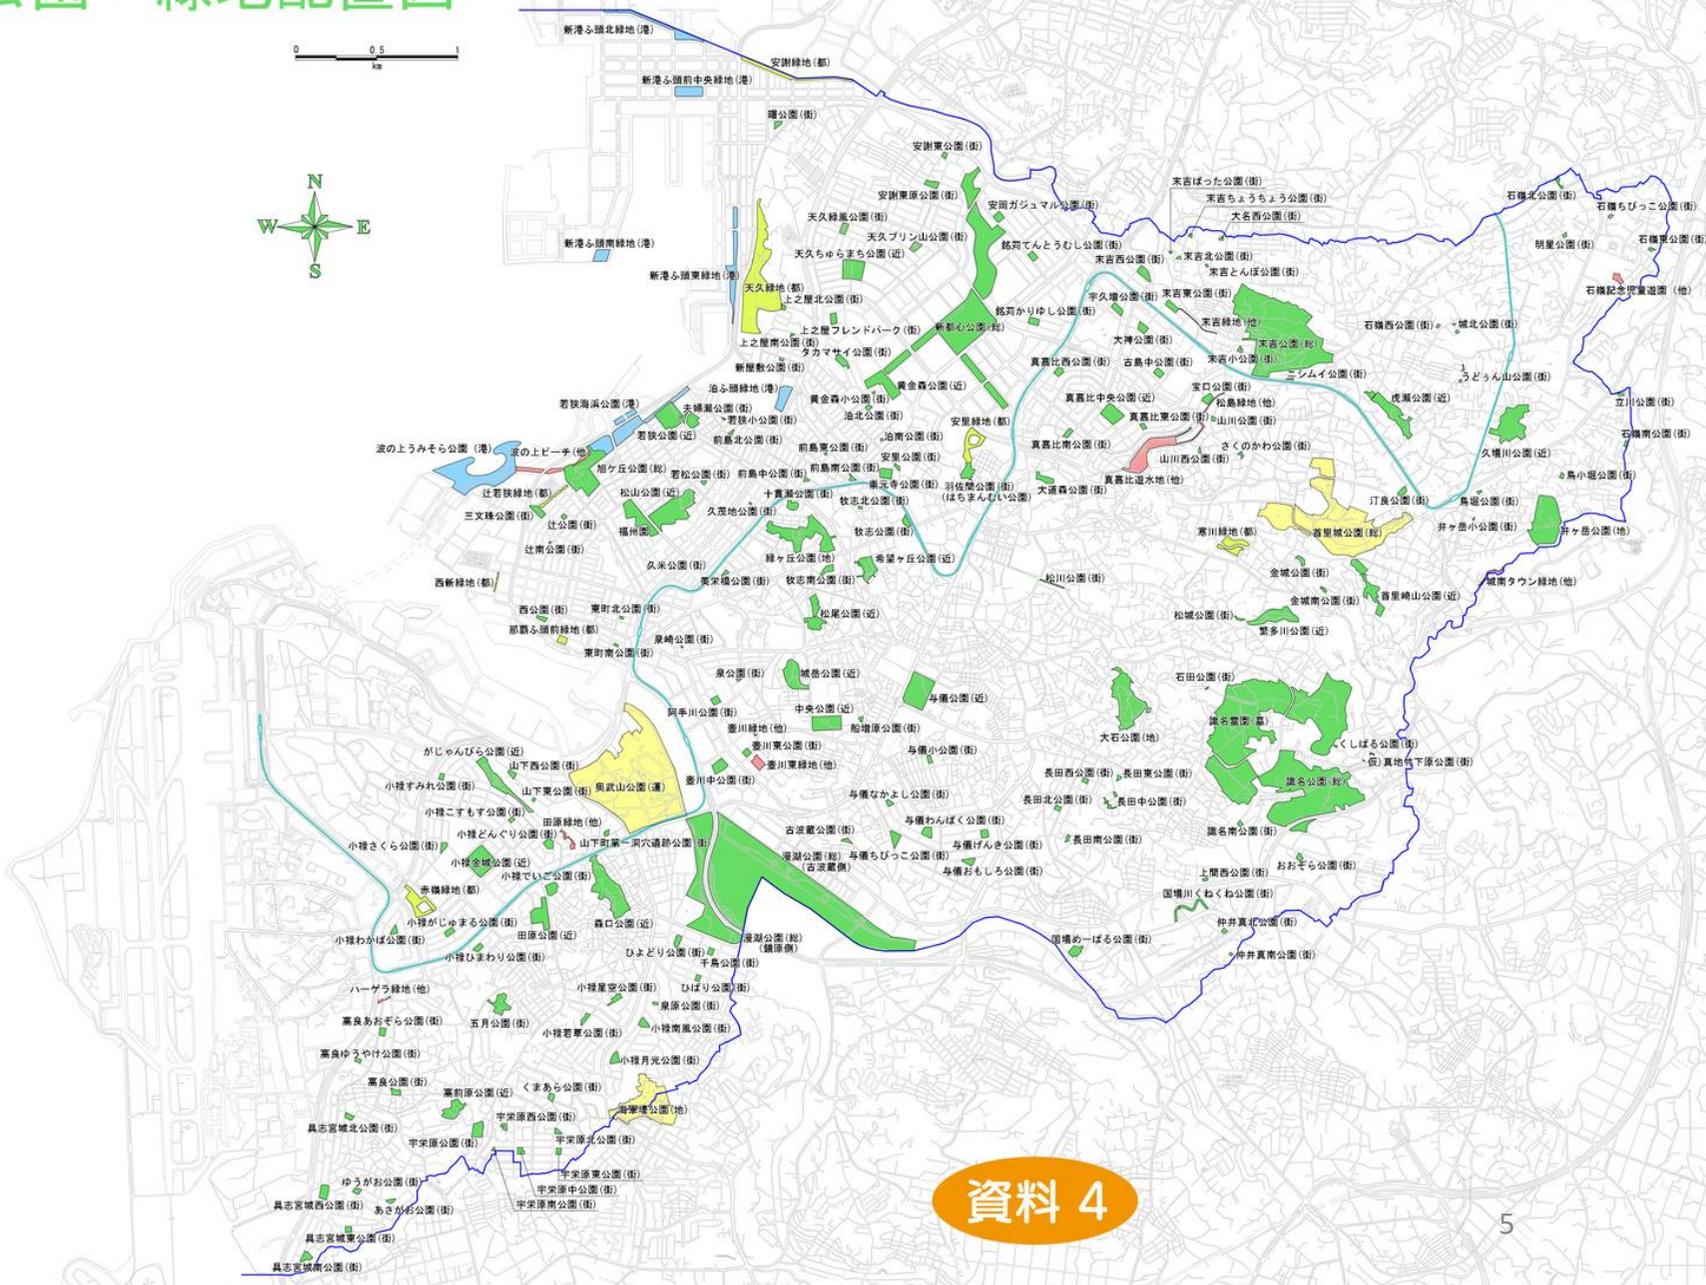

凡例

都市公園(市)	緑色
都市緑地	黄色
その他緑地等	薄緑色
港湾緑地	青色
都市公園(県)	薄黄色

資料 4

本庁・真和志支所・首里支所・小禄支所の管内別の公園比較

	本庁管内	真和志支所管内	首里支所管内	小禄支所管内
公園数	68	37	31	39
面積 (ha)	134.07	26.86	19.62	17.34

有料公園施設

若狭公園 / (テニス)

漫湖公園 / (テニス) / (多目的広場) / (屋外ステージ・1,100人収容)

新都心公園 / (テニス) / (多目的広場人工芝グラウンド) / (屋外ステージ・1,300人収容)

松山公園 / (テニス)

大石公園 / (テニス)

中央公園 / (テニス)

真嘉比遊水地 / (多目的広場)

与儀公園 / (屋外ステージ・850人収容)

福州園 / 中国式庭園

人口一人あたりの公園面積

全国平均 10.7㎡

沖縄平均 11.0㎡

那覇市平均 5.8㎡

本庁管内 14㎡

真和志支所管内 3㎡

首里支所管内 3㎡

小禄支所管内 3㎡

1. 石垣市 49.71㎡

2. 宮古島市 21.94㎡

3. 名護市 19.59㎡

4. 糸満市 17.06㎡

5. 沖縄市 9.03㎡

6. うるま市 8.57㎡

7. 豊見城市 7.99㎡

8. 南城市 7.81㎡

9. 那覇市 5.79㎡

10. 浦添市 5.53㎡

11. 宜野湾市 3.86㎡

※浦添市・宜野湾市は米軍基地の影響を受けている。

那覇市内で整備中の公園・緑地

◆本庁管内

完成見通しについては、予算の確保、用地取得や墳墓補償、関連事業（文化財発掘調査等）との調整などにより、事業施行期間を延長する可能性があります。

緑ヶ丘公園整備概要

公園の種別：地区公園　公園の面積：3.60ha(㌔)

那覇広域都市計画公園事業　当初都市計画決定：1956年3月23日　都市計画事業認可：1972年9月20日

事業施行期間：1972年9月20日から2027年3月31日まで

総事業費：約105億円（予定）進捗状況：事業費ベースで93.9%（2021年度末時点）

事業進捗の課題（主な遅れの要因）　文化財発掘調査、予算の確保

希望ヶ丘公園整備概要

公園の種別：近隣公園　公園の面積：1.08ha(㌔)

那覇広域都市計画公園事業　当初都市計画決定：1956年3月23日　都市計画事業認可：1972年11月2日

事業施行期間：1972年11月2日から2026年3月31日まで

総事業費：約11億円（予定）進捗状況：事業費ベースで84.4%（2021年度末時点）

事業進捗の課題（主な遅れの要因）　用地取得、予算の確保

城岳公園整備概要

公園の種別：近隣公園　公園の面積：1.60ha(㍊)

那覇広域都市計画公園事業　当初都市計画決定：1956年3月23日　都市計画事業認可：1981年4月27日

事業施行期間：1981年4月27日から2025年3月31日まで

総事業費：約39億円（予定）　進捗状況：事業費ベースで85.7%（2021年度末時点）

事業進捗の課題（主な遅れの要因）　文化財発掘調査、予算の確保

牧志南公園整備概要

公園の種別：街区公園　公園の面積：0.37ha(㍊)

那覇広域都市計画公園事業　当初都市計画決定：1956年3月23日　都市計画事業認可：2009年6月9日

事業施行期間：2009年6月9日から2026年3月31日まで

総事業費：約12億円（予定）　進捗状況：事業費ベースで39.6%（2021年度末時点）

事業進捗の課題（主な遅れの要因）　墳墓補償、予算の確保

十貫瀬公園整備概要

公園の種別：街区公園　公園の面積：0.28ha(㍊)

那覇広域都市計画公園事業　当初都市計画決定：1972年5月12日　都市計画事業認可：2014年4月22日

事業施行期間：2014年4月22日から2025年3月31日まで

総事業費：約7億円（予定）　進捗状況：事業費ベースで9.1%（2021年度末時点）

事業進捗の課題（主な遅れの要因）　墳墓補償、予算の確保

天久緑地整備概要

公園の種別：都市緑地　公園の面積：7.90ha(㈬)

那覇広域都市計画公園事業　当初都市計画決定：1971年6月25日　都市計画事業認可：1992年10月2日
事業施行期間：1992年10月2日から2028年3月31日まで
総事業費：約147億円（予定）　進捗状況：事業費ベースで22.4%（2021年度末時点）
事業進捗の課題（主な遅れの要因）　墳墓補償、予算の確保

安里緑地整備概要

公園の種別：都市緑地　公園の面積：0.27ha(㈬)　※安里配水池を含む全体では0.98ha(㈬)

那覇広域都市計画公園事業　都市計画決定変更：2012年2月29日　都市計画事業認可：2012年4月24日
事業施行期間：2012年4月24日から2024年3月31日まで
総事業費：約3億円（予定）　進捗状況：事業費ベースで70.9%（2021年度末時点）
事業進捗の課題（主な遅れの要因）　文化財調査、予算の確保

那覇ふ頭前緑地整備概要

公園の種別：都市緑地　公園の面積：0.22ha(㈬)

那覇広域都市計画公園事業
当初都市計画決定：1977年10月11日　都市計画事業認可：2010年7月30日
事業施行期間：2010年7月30日から2026年3月31日まで
総事業費：約3億円（予定）

資料 7-3

◆真和志支所管内

完成見通しについては、予算の確保、用地取得や墳墓補償、関連事業（文化財発掘調査等）との調整などにより、事業施行期間を延長する可能性があります。

識名公園の概要

整備概要

公園の種別：総合公園　公園の面積：15.60ha(22)

那覇広域都市計画公園事業

当初都市計画決定：1971年6月25日

都市計画事業認可：1983年8月8日

事業施行期間：1983年8月8日から2024年3月31日まで

総事業費：約158億円（予定）

進捗状況：事業費ベースで82.0%（2021年度末時点）

事業進捗の課題（遅れの要因）：1）高低差のある敷地

2）関連事業との調整

3）予算の確保（社会資本整備総合交付金）

完成予定：現事業認可では2023年度までとなっているが2028年度まで期間延長の予定（さらに再度延長の可能性有）

資料 7-4

◆首里支所管内

完成見通しについては、予算の確保、用地取得や墳墓補償、関連事業（文化財発掘調査等）との調整などにより、事業施行期間を延長する可能性があります。

久場川公園の整備概要

公園の種別：近隣公園　公園の面積：3.00ha(㍊)

那覇広域都市計画公園事業　当初都市計画決定：1995年2月27日　都市計画事業認可：2006年7月11日

事業施行期間：2006年7月11日から2028年3月31日まで

総事業費：約71億円(予定)　進捗状況：事業費ベースで33.8%(2021年度末時点)

事業進捗の課題（遅れの要因）：1) 高低差のある敷地　2) 用地取得の難航
2-1) 多数存在する不明墳墓　2-2) 相続未登記や相続人多数の土地
2-3) 土地所有者と墳墓所有者が異なる土地　2-4) 土地境界に争いがある土地
2-5) 事業への反対　3) 予算の確保（沖縄振興公共投資交付金）

完成予定：現事業認可では2027年度までとなっているが期間延長の可能性有（未定）

虎瀬公園整備概要

公園の種別：近隣公園　公園の面積：2.70ha(㍊)

那覇広域都市計画公園事業　当初都市計画決定：1971年6月25日　都市計画事業認可：1982年5月6日

事業施行期間：1982年5月6日から2027年3月31日まで

総事業費：約21億円(予定)　進捗状況：事業費ベースで81.2%(2021年度末時点)

事業進捗の課題（主な遅れの要因）　予算確保

資料 7-5

末吉公園整備概要

公園の種別：総合公園　公園の面積：18.76ha(22)

那覇広域都市計画公園事業　当初都市計画決定：1971年6月25日　都市計画事業認可：1972年9月20日

事業施行期間：1972年9月20日から2027年3月31日

総事業費：約108億円(予定)　進捗状況：事業費ベースで93.5% (2021年度末時点)

事業進捗の課題（主な遅れの要因）　文化財調査、予算の確保

◆小祿支所管内

完成見通しについては、予算の確保、用地取得や墳墓補償、関連事業（文化財発掘調査等）との調整などにより、事業施行期間を延長する可能性があります。

森口公園整備概要

公園の種別：近隣公園　公園の面積：3.69ha(㍊)


那覇広域都市計画公園事業　当初都市計画決定：1971年6月25日　都市計画事業認可：1990年6月15日

事業施行期間：1990年6月15日から2027年3月31日まで

総事業費：約75億円（予定）　進捗状況：事業費ベースで56.2%（2021年度末時点）

事業進捗の課題（主な遅れの要因）　墳墓補償、予算の確保

公園整備の課題



- ・ 予算の確保と用地取得


- ・ 墳墓（ふんぼ）補償

- ・ 文化財発掘調査など
関連事業との調整


那覇市都市計画 マスタープラン

小公園や広場、
ポケットパークの
憩いの空間の創出

地域まちづくり方針
→新たな公園整備の
施策の推進



公園整備の促進へ



- ・ 公園の新設・面積を増やす
- ・ 誰もが使いやすい
ユニバーサルデザイン
- ・ 遊具の修繕と更新。わくわく
楽しめる遊具・施設の新設

現在整備中の公園が完成すると
那覇市の一人当たり公園面積は
5.8→9.2平方メートルへ



ご清聴、誠にありがとうございました。
