2020年　10月　～　2020年　12月　3カ月工程表

工事名	那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)	施工者	國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体	工期	自　2018年10月4日 至　2021年3月23日

月	10月																														
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
書類・施工図作成					平面詳細図、天井伏せ図修正・部分詳細図作成、各種施工計画書作成																										
立会検査					配筋、圧接UT、生コン受入検査、内装工事関係検査																										
共通仮設工事	仮設構台撤去、スロープ改造																														
直接仮設工事					躯体、内装工事に合わせて内外部足場組立、解体、盛替え																										
鉄筋工事					大ホール　6b階柱・壁・梁配筋															大練習室1～2階柱・壁・梁配筋												
型枠工事					大ホール　6b階柱・壁型枠建込み															大練習室1～2階柱・壁型枠建込み												
コンクリート工事									6a～6b階躯体									10／13　～大練習室1階躯体												
鉄骨工事 (建方・本締め)				北風除室、小ホール客席ギャラリー、トップライト下地、ウナー天井下地、3階室外機置場下地																											
左官工事					3～5階　柱・梁左官補修　枠廻りモルタル詰め					2～3階塗壁仕上げ																					
防水工事									1～4階　内外部シール打									小ホール屋根ウレタン防水												
金属工事					1～4階　軽鉄壁・天井下地組					各所照明BOX取付、					EXP.J取付、金物、手摺取付															
内外装工事	1～4階　壁・天																														
金属製建具工事				3・																											
鉄骨工事 (耐火被覆・塗装)	3～5階　耐火塗																														
金属工事 (HPC工事)					大																										
塗装工事					外																										
屋根及びとい工事																															
木工事	煙突取付																														
石工事																															
タイル工事																															
ユニット及びその他工事	※11月度も揚重機作業、生コン打設作業に伴い、騒音・振動が発生致します。 ご協力お願い致します。																														
既製コンクリート工事	※11月度も、工程によって日曜日に作業を行う場合があります。 基本的には、騒音にならない程度の作業を予定しています。 日曜作業をする場合は、その都度、作業内容等をご連絡致します。																														
昇降機設備工事	お問い合わせ：那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築) 國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体 ☎:098-917-0170																														
外構工事																															
重機・はつり・振動作業																															
鉄骨・資材等(トレーラー・トラック)																															
生コン打設(ミキサー車)																															

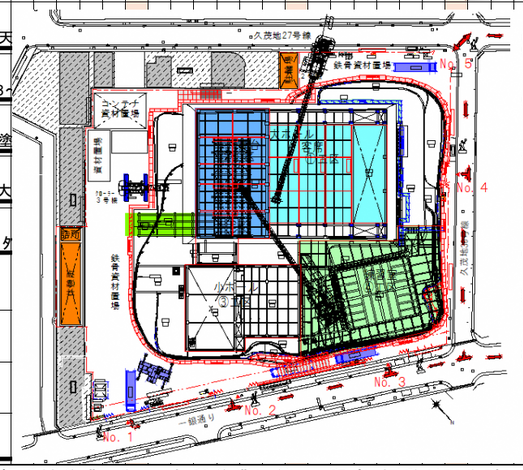

月	11月																														
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
書類・施工図作成									平面詳細図修正、　金物製作図作成、　外構図作成、　各種施工計画書作成																						
立会検査									配筋、圧接UT、生コン受入検査、内外装工事関係検査																						
共通仮設工事																										タワークレーン(2号機)解体					
直接仮設工事									躯体、内装工事に合わせて内外部足場組立、解体、盛替え																						
鉄筋工事											大練習室2～3階柱・壁・梁配筋																				
型枠工事											大練習室2～3階柱・壁型枠建込み																				
コンクリート工事																～11／6	6b階躯体					大練習室2～3階躯体									
鉄骨工事 (建方・本締め)									大・小ホール天井下地、ウナー天井下地、各所階段敷付、搬入口外壁下地																						
左官工事											3～6階　柱・梁左官補修　枠廻りモルタル詰め　2～3階塗壁仕上げ																				
防水工事											1～6階　内外部シール打、小ホール各階ウレタン防水																				
金属工事											2～5階　軽鉄壁・天井下地組　各所照明BOX取付、EXP.J取付、金物、手摺取付																				
内外装工事									1～6階　壁・天井ボード張り、GWB貼り、発泡ウレタン吹付2階～　床長尺シート貼り、OAフロアー																				
金属製建具工事											3～4階　AW、ACW、SD枠、シャッター建付　ガラス取付																				
鉄骨工事 (耐火被覆・塗装)											6階ロックウール吹付																				
金属工事 (HPC工事)											大・小ホール2階・4階　首里織HPC取付																				
塗装工事									外壁、パラペット塗装　1～5階　内部壁・天井塗装																						
屋根及びとい工事									11／2～　縦どい取付																						
木工事															11／24～楽屋廻り造作工事																
石工事											3階便所汚垂石取付、1～2階面台取付																				
タイル工事											2～3便所壁・床タイル貼り																				
ユニット及びその他工事									1～2階トイレブース取付、練習室・電気室浮き床、小ホール反射板仕上げ																						
既製コンクリート工事																															
昇降機設備工事											11／2～　EV4号機組立																				
外構工事																															
重機・はつり・振動作業									8:00～18:00　コンクリート整形時のはつり・振動作業																						
鉄骨・資材等(トレーラー・トラック)									8:00～18:00　搬入トレーラーの出入りはNo.1.2.5ゲート使用																						
生コン打設(ミキサー車)									8:00～18:00　ミキサー車の出入りはNo.1.2.5ゲート使用																						

月	12月																														
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
書類・施工図作成	平面詳細図修正、　金物製作図作成、　外構図作成、　各種施工計画書作成																														
立会検査	配筋、圧接UT、生コン受入検査、内外装工事関係検査																														
共通仮設工事																				タワークレーン(1号機)解体								12/30			
直接仮設工事	躯体、内装工事に合わせて内外部足場組立、解体、盛替え																													年末年始休み	
鉄筋工事	大練習室4階柱・壁・梁配筋															大練習室3・4階後打ち壁配筋															
型枠工事	大練習室4階柱・壁型枠建込み															大練習室3・4階後打ち壁型枠建込み															
コンクリート工事	～　12／11　大練習室4階躯体																			～　12／28　大練習室3・4階後打ち壁											
鉄骨工事 (建方・本締め)	大練習室ギャラリー下地、ウナー天井下地、各所階段取付																														
左官工事	3～6階　柱・梁左官補修　枠廻りモルタル詰め　2～3階塗壁仕上げ、吸音左官																														
防水工事	1～6階　内外部シール打　大ホール屋根・各階ウレタン防水　小ホール2階アスファルト防水																														
金属工事	2～5階　軽鉄壁・天井下地組　各所照明BOX取付、EXP.J取付、金物、手摺取付																														
内外装工事	1～6階　壁・天井ボード張り、GWB貼り、発泡ウレタン吹付3階～　床長尺シート貼り、OAフロアー																														
金属製建具工事	3～6階　AW、ACW、SD枠、シャッター建付　ガラス取付																														
鉄骨工事 (耐火被覆・塗装)	大練習室廻り　1～2階　耐火塗装、ロックウール吹付																														
金属工事 (HPC工事)																															
塗装工事	外壁、パラペット塗装　1～5階　内部壁・天井塗装																														
屋根及びとい工事	縦どい取付　練習室2屋根屋根葺き																														
木工事	楽屋廻り造作工事、小ホール客席・舞台ワゴン床下地組、各所縞付合板貼り																														
石工事	4階便所汚垂石取付、3～4階面台取付																														
タイル工事	4便所壁・床タイル貼り																														
ユニット及びその他工事	3～4階トイレブース取付、小ホール反射板仕上げ																														
既製コンクリート工事	小ホール花ブロック積み																														
昇降機設備工事	EV4号機組立　～12／29																														
外構工事	12／1～　外構工事(排水工事、囲障工事)																														
重機・はつり・振動作業																															
鉄骨・資材等(トレーラー・トラック)																															
生コン打設(ミキサー車)																															
