2020年　4月　～　2020年　6月　３カ月工程表

工事名	那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（建築）	施工者	國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体	工期	自　2018年10月4日 至　2021年3月23日

月	4月																												
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
書類・施工図作成						平面詳細図、天井伏せ図修正・6階躯体図作成、各種施工計画書作成																								
立会検査						配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査																								
共通仮設工事				4／8　クローラークレーン組立（朝礼広場側）																										
直接仮設工事						鉄骨建方、躯体工事に合わせて内外部足場組立																								
鉄筋工事						2,3階柱・壁配筋　3,4階梁配筋																								
型枠工事						2,3階柱・壁型枠建込み　3,4階スラブ掛け																								
コンクリート工事						3／31　～　5／12　2階躯体																								
鉄骨工事（建方・本締め）						5／8～　①②③工区鉄骨建方（3、4節）、建て入れ直し、ボルト本締め、デッキ張り、スタッド打																							
左官工事												地下1・2階、地上1階各所左官補修																	
防水工事																									消火・雑用水槽防水				
金属工事						1階　軽鉄壁下地組																								
内外装工事						1階　壁ボード張り、発泡ウレタン吹付、UB取付																								
金属製建具工事						1階　AW枠建付、SD枠建付　地下1・2階シャッター建付　ガラス取付																								
鉄骨工事（耐火被覆・塗装）													1階　耐火塗装、ロックウール吹付																
金属工事（ＨＰＣ工事）																													
塗装工事																													
はつり・振動作業																													
鉄骨建方（トレーラー・トラック）																													
生コン打設（ミキサー車）																													
備考		第15回安全大会		第68回定例会議		店社パトロール			第69回定例会議			第70回定例会議				第71回定例会議			第17回安衛協	昭和の日									

月	5月																												
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
書類・施工図作成								平面詳細図、天井伏せ図修正・6階躯体図作成、各種施工計画書作成																							
立会検査								配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査																							
共通仮設工事																															
直接仮設工事								鉄骨建方、躯体工事に合わせて内外部足場組立																							
鉄筋工事								3,4階柱・壁配筋　4,5階梁配筋																							
型枠工事								3,4階柱・壁型枠建込み　4,5階スラブ掛け																							
コンクリート工事												4／24　～　6／20　3階躯体																			
鉄骨工事（建方・本締め）																		5／18大ホール舞台すの受梁組立　5／25～6／20　④工区練習室鉄骨建方												
左官工事												地上1・2階各所左官補修																			
防水工事																															
金属工事								1階　軽鉄壁・天井下地組　5／11～　2階間仕切スミ出し、　軽鉄壁下地組																							
内外装工事																			5／20～　2階　壁ボード張り、発泡ウレタン吹付、UB取付												
金属製建具工事																			5／15～　2階　AW枠建付、SD枠、シャッター建付　ガラス取付												
鉄骨工事（耐火被覆・塗装）																									5／25～　2階　耐火塗装、ロックウール吹付						
金属工事（ＨＰＣ工事）																															
塗装工事								5／7～　2階　首里織HPC、パラペット塗装　7・8工区⇒3工区																							
はつり・振動作業											8:00～18:00　コンクリート整形時のはつり・振動作業																			
鉄骨建方（トレーラー・トラック）				8:00～18:00							搬入トレーラーの出入りはNo1.2.5ゲート使用																			
生コン打設（ミキサー車）								8:00～18:00			ミキサー車の出入りはNo.1.2.5ゲート使用																			
備考	第72回定例会議	憲法記念日	みどりの日	こどもの日	振替休日	第16回安全大会	第73回定例会議			店社パトロール			第74回定例会議				第75回定例会議			第18回安衛協	第76回定例会議										

月	6月																												
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
書類・施工図作成	平面詳細図、天井伏せ図修正・6階躯体図作成、各種施工計画書作成																												
立会検査	配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査																												
共通仮設工事																													
直接仮設工事	鉄骨建方、躯体工事に合わせて内外部足場組立																												
鉄筋工事	4階柱・壁配筋　5階梁配筋																												
型枠工事	4階柱・壁型枠建込み　5階スラブ掛け																												
コンクリート工事							5／22　～　7／20　4階躯体																						
鉄骨工事（建方・本締め）																													
左官工事	地上2・3階各所左官補修																												
防水工事																													
金属工事																													
内外装工事																													
金属製建具工事																													
鉄骨工事（耐火被覆・塗装）																													
金属工事（ＨＰＣ工事）	6／1～　2階　首里織HPC取付　7・8工区⇒3工区																												
塗装工事																													
はつり・振動作業																													
鉄骨建方（トレーラー・トラック）																													
生コン打設（ミキサー車）																													
備考	第17回安全大会			店社パトロール		第77回定例会議				第78回定例会議				第79回定例会議			第19回安衛協		第80回定例会議										

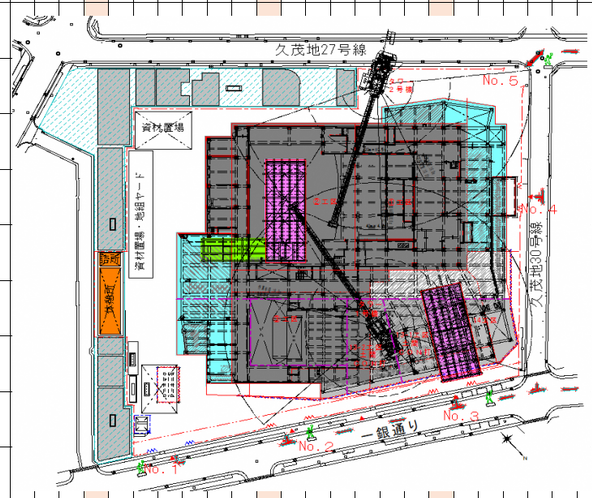

※5月度も揚重機作業、生コン打設作業に伴い、騒音・振動が発生致します。
　ご協力お願い致します。
※5月度も、工程によって日曜日に作業を行う場合があります。
　基本的には、騒音にならない程度の作業を予定しています。
　日曜作業をする場合は、その都度、作業内容等をご連絡致します。

お問い合わせ：那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（建築）
　　國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体
　　☎：098-917-0170
