2021年　1月　～　2021年　3月　　3カ月工程表

工事名	那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)	施工者	國場組・大米建設・金城キク建設 ・ニシダ工業　共同企業体
工期	自　2018年10月4日 至　2021年5月31日		

月	1月	2月	3月
日付	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日	金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日	月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日	月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
書類・施工図作成	平面詳細図・金物製作図修正、　外構図作成	平面詳細図・金物製作図修正　　竣工図、寸効書類作成	竣工図、寸効書類作成
立会検査	内外装工事関係検査	内外装工事関係検査	内外装工事関係検査
共通仮設工事	相番機組立　　タワークレーン(1号機)解体　　相番機解体	乗入れ構台撤去　　乗入れ構台撤去	
直接仮設工事	内外装工事に合わせて足場解体、盛替え	内外装工事に合わせて足場解体、盛替え	内装工事に合わせて足場解体　　～　3／31予定
コンクリート工事	1／22 TC開口塞ぎ	搬入口土間コン　　1階スラブコン	
鉄骨工事(建方・本締め)		ウナー天井下地付　　～2／13予定	
鉄骨工事(耐火被覆・塗装)			
金属工事(HPC工事)		⇒　2階　首里織HPC取付　～　2／13予定	
既製コンクリート工事		大練習室廻り花ブロック積み	大練習室廻り花ブロック積み　～3／13予定
防水工事		1～5階　内外部シール打　　各階ウレタン防水、2階アスファルト防水	各階ウレタン防水、2階アスファルト防水～　3／13予定
左官工事		吸音左官　　大練習室1～4階　柱・梁左官補修　　大ホール段床、各階床補修	大ホール段床、各階床補修　　～　3／31予定
屋根及びとい工事		縦どい取付　　～2／20	
金属工事		大ホール2～5階、大練習室1～2階　軽鉄壁・天井下地組　　各所照明BOX取付、金物、手摺取付	大練習室1～4階　軽鉄壁・天井下地組　　各所照明BOX取付、金物、手摺取付
石工事			
タイル工事		り　大ホール客席壁タイル貼り	大ホール客席壁タイル貼り　　～　3／31予定
木工事		ホール反射板仕上げ、楽屋廻り造作工事、大小ホール客席・舞台ワゴン床下地組、各所練付合板貼り	大ホール反射板仕上げ、楽屋廻り造作工事、大小ホール客席・舞台ワゴン床下地組、各所練付合板貼り
金属製建具工事		大練習室3～4階　SD枠建付、ドア吊込み	各所ドア吊込み、調整
塗装工事		大練習室外壁塗装　　1～4階　内部壁・天井塗装	大練習室　1～4階　内部壁・天井塗装
内外装工事		1～5階壁・天井ボード張り、GWB貼り　　フローリング貼り、床長尺シート貼り、OAフロアー	大練習室1～4階壁・天井ボード張り、GWB貼り　　フローリング貼り、タイルカーペット貼り
ユニット及びその他工事		大ホール反射板仕上げ、大練習室浮き構造工事、小ホール客席イス取付、各階洗面カウンター取付	大ホール反射板仕上げ、大練習室浮き構造工事、ミニキッチン、カウンター、化粧台、管理扉取付
昇降機設備工事			
外構工事		外構工事(CB撤去工事、擁壁工事、排水工事、囲障工事)	外構工事(CB撤去工事、擁壁工事、排水工事、囲障工事)
重機・はつり・振動作業		8:00～18:00　コンクリート整形時のはつり・振動作業、掘削作業	
資材搬入・残土搬出(トレーラー・10tトラック)		8:00～18:00　搬入トレーラーの出入りはNo1.2.3.4.5ゲート使用	
生コン打設(ミキサー車)		8:00～18:00　ミキサー車の出入りはNo.1ゲート使用	

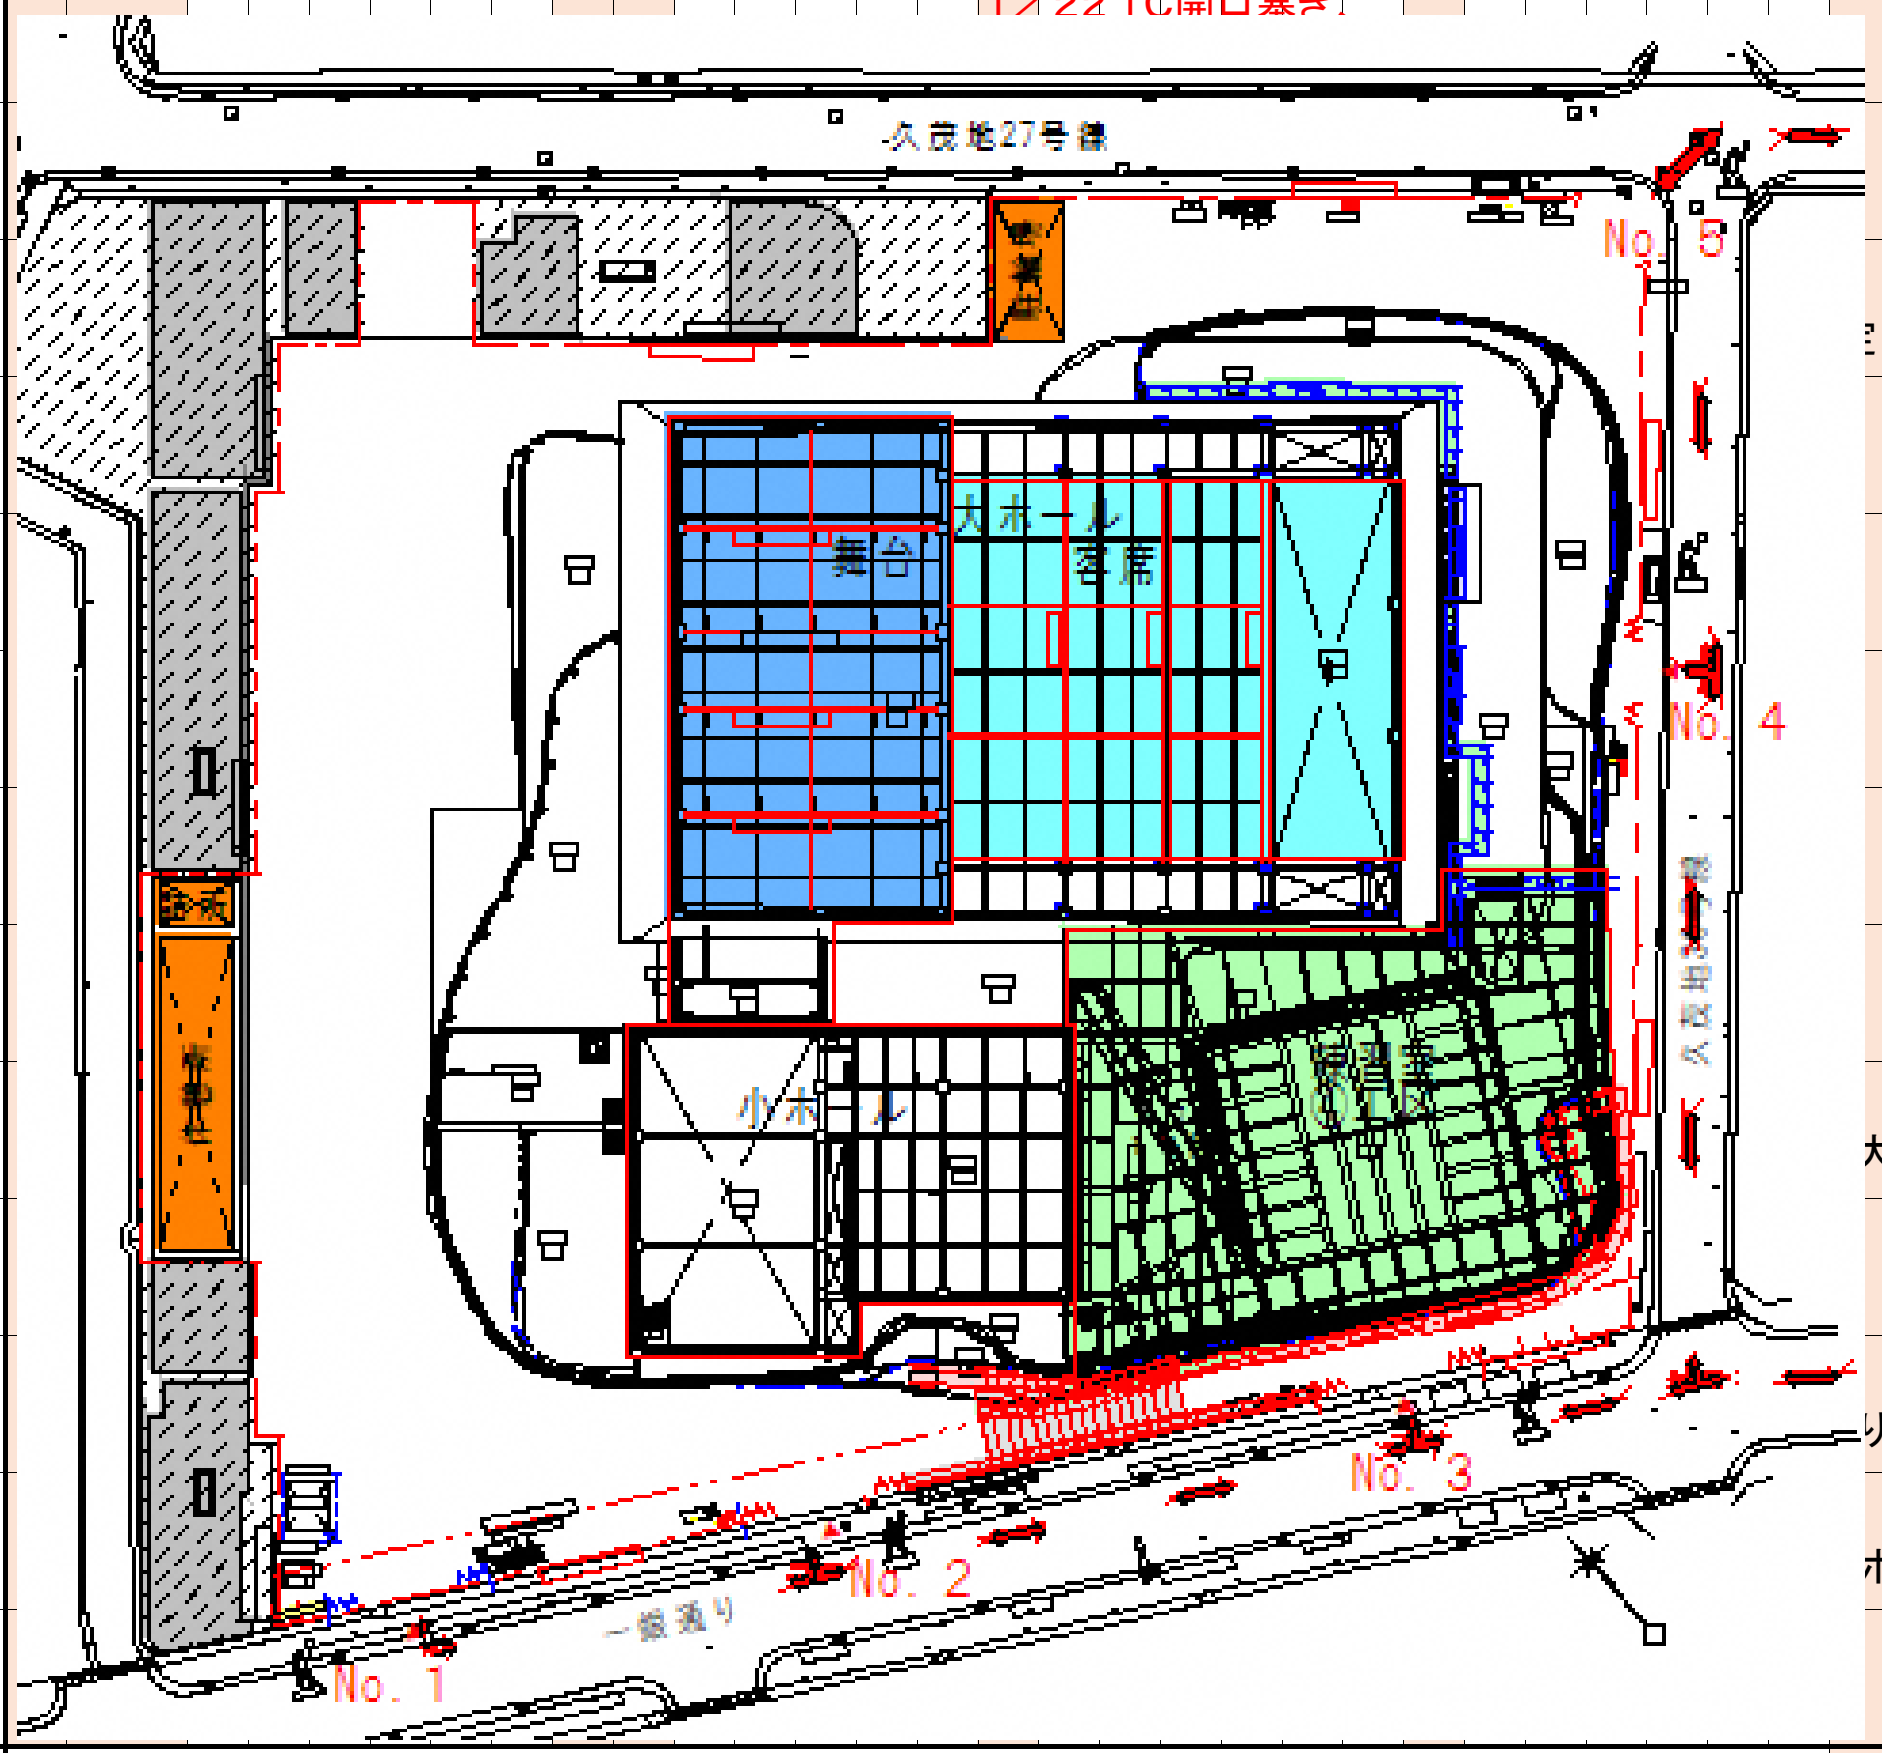

※2月度も揚重機作業、生コン打設作業に伴い、騒音・振動が発生致します。
ご協力お願い致します。

※2月度も、工程の遅れにより日曜日を作業を行う予定です。
基本的には、内装仕上工事ですので、大型車両の出入りや
騒音の出る作業は行いません。
何かとご不便・ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、
細心の注意を払いながら作業を進めて参りますので、何卒ご理解、
ご協力を賜わりますようお願い申し上げます。
何かお気付きの点がございましたら下記までご連絡くださいますよう
お願い致します。

日曜作業日：令和3年2月7日、14日、21日、28日
作業時間：AM 9:00 ～ PM 5:00頃まで

お問い合わせ：那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)
國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体
☎：098-917-0170
