2020年　6月　～　2020年　8月　3カ月工程表

工事名	那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)	施工者	國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体	工期	自　2018年10月4日 至　2021年3月23日

月	6月																														
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
書類・施工図作成	平面詳細図、天井伏せ図修正・6階躯体図作成、各種施工計画書作成																														
立会検査	配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査																														
共通仮設工事																															
直接仮設工事	鉄骨建方、躯体工事に合わせて内外部足場組立																														
鉄筋工事								4、5階柱・壁配筋							5、6階梁スラブ配筋																	
型枠工事								4、5階柱・壁型枠建込み							5、6階梁スラブ掛け																	
コンクリート工事															4／24	～			7／3	3階躯体											
鉄骨工事 (建方・本締め)	6／1大ホール舞台すのこ組立														6／10～6／30		④工区大練習室鉄骨建方(1節)														
左官工事								2・3階各所左官補修																							
防水工事																					1、2階内外部シール打										
金属工事								1、2階軽鉄壁・天井下地組																							
内外装工事								1、2階　壁ボード張り、発泡ウレタン吹付、UB取付																							
金属製建具工事								1、2階　AW枠建付、SD枠、シャッター建付　ガラス取付																							
鉄骨工事 (耐火被覆・塗装)								1、2階　耐火塗装、ロックウール吹付																							
金属工事 (ＨＰＣ工事)																															
塗装工事								すのこ塗装																							
木工事																															
備考																															

月	7月																														
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
書類・施工図作成	平面詳細図、天井伏せ図修正・部分詳細図作成、各種施工計画書作成																														
立会検査	配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査																														
共通仮設工事																															
直接仮設工事	鉄骨建方、躯体工事に合わせて内外部足場組立																														
鉄筋工事	5、6階柱・壁配筋							6、R階梁配筋							大練習室1階柱・壁配筋							2階梁配筋									
型枠工事	5、6階柱・壁型枠建込み							6、R階スラブ掛け							大練習室1階柱・壁型枠建込み							2階スラブ掛け									
コンクリート工事					6／5	～		7／30	4,5階躯体											7／28	～大練習室1階躯体										
鉄骨工事 (建方・本締め)	7／1　大ホール客席天井、すのこ梁組立 7／3～7／25　④工区大練習室鉄骨建方(2節)																			7／22　小ホール舞台すのこ組立				7／27	大・小舞台床組立						
左官工事	地上3・4・5階各所左官補修																														
防水工事													2、3階内外部シール打																		
金属工事	7／1～　3階間仕切スミ出し、　軽鉄壁下地組																														
内外装工事	7／10～　3階　壁ボード張り、発泡ウレタン吹付、UB取付																														
金属製建具工事	7／10～　3階　AW枠建付、SD枠、シャッター建付　ガラス取付																														
鉄骨工事 (耐火被覆・塗装)	7／13～　3階　耐火塗装、ロックウール吹付																														
金属工事 (ＨＰＣ工事)																				7／15～　2階　首里織HPC取付											
塗装工事	7／1～　外壁、パラペット塗装																			7／20～　1階　内部壁・天井塗装											
木工事	3階　額縁取付																														
備考																															

月	8月																														
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
書類・施工図作成	平面詳細図、天井伏せ図修正・部分詳細図作成、各種施工計画書作成																														
立会検査	配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査																														
共通仮設工事																															
直接仮設工事	鉄骨建方、躯体工事に合わせて内外部足場組立、盛替え																														
鉄筋工事	5、6階柱・壁配筋								6、R階梁配筋								大練習室2階柱・壁配筋							3階梁配筋						
型枠工事	5、6階柱・壁型枠建込み								6、R階スラブ掛け								大練習室2階柱・壁型枠建込み							3階スラブ掛け						
コンクリート工事	7／7	～	8／30	6階躯体					7／28	～	9／30		大練習室1～4階躯体																		
鉄骨工事 (建方・本締め)										～8／15大ホール客席天井、すのこ梁組立																					
左官工事	地上3・4・5・6階各所左官補修																														
防水工事	3、4階内外部シール打																														
金属工事	8／1～　4階間仕切スミ出し、　軽鉄壁下地組																														
内外装工事	8／10～　4階　壁ボード張り、発泡ウレタン吹付、UB取付																														
金属製建具工事	8／10～　4階　AW枠建付、SD枠、シャッター建付　ガラス取付																														
鉄骨工事 (耐火被覆・塗装)	8／15～　4階　耐火塗装、ロックウール吹付																														
金属工事 (ＨＰＣ工事)	2階　・　4階　首里織HPC取付																														
塗装工事	外壁、パラペット塗装									1階　内部壁・天井塗装																					
木工事	大・小ホール舞台床下地組																														
備考																															

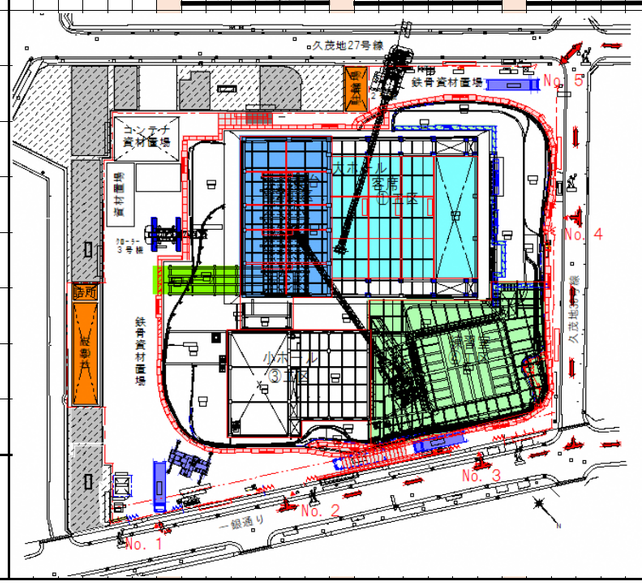

※7月度も揚重機作業、生コン打設作業に伴い、騒音・振動が発生致します。
　ご協力お願い致します。
※7月度も、工程によって日曜日に作業を行う場合があります。
　基本的には、騒音にならない程度の作業を予定しています。
　日曜作業をする場合は、その都度、作業内容等をご連絡致します。

お問い合わせ：那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)
國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体
☎:098-917-0170

8:00～18:00　コンクリート整形時のはつり・振動作業

8:00～18:00　搬入トレーラーの出入りはNo1.2.5ゲート使用

8:00～18:00　ミキサー車の出入りはNo.1.2.5ゲート使用

第18回安全大会　第81回定例会議　第82回定例会議　第83回定例会議　海の日　第84回定例会議　スポーツの日　第20回安衛協　第85回定例会議　第19回安全大会　第86回定例会議　山の日　第87回定例会議　第88回定例会議　第21回安衛協　第89回定例会議
