2020年　3月　～　2020年　5月　3カ月工程表

工事名	那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)	施工者	國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体	工期	自　2018年10月4日 至　2021年3月23日

月	3月
日付	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日	日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

月	4月
日付	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
曜日	水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

月	5月
日付	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日	金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

月	3月	4月	5月
書類・施工図作成	平面詳細図、天井伏せ図修正・6階躯体図作成	平面詳細図、天井伏せ図修正・6階躯体図作成、各種施工計画書作成	平面詳細図、天井伏せ図修正・6階躯体図作成、各種施工計画書作成
立会検査	配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査	配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査	配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査
共通仮設工事		4／8　クローラークレーン組立(朝礼広場側)	
直接仮設工事	鉄骨建方、躯体工事に合わせて内外部足場組立	鉄骨建方、躯体工事に合わせて内外部足場組立	鉄骨建方、躯体工事に合わせて内外部足場組立
鉄筋工事	2階柱・壁配筋　3階梁配筋	2,3階柱・壁配筋　3,4階梁配筋	3,4階柱・壁配筋　4,5階梁配筋
型枠工事	2階柱・壁型枠建込み　3階スラブ掛け	2,3階柱・壁型枠建込み　3,4階スラブ掛け	3,4階柱・壁型枠建込み　4,5階スラブ掛け
コンクリート工事	～　3／20　1階躯体	3／31　～　5／8　2階躯体	5／12　～　6／20　3階躯体
鉄骨工事(建方・本締め)	鉄骨建方(2節)　、建て入れ直し、　ボルト本締め、デッキ張り、スタッド打	4／6～　①②③工区鉄骨建方(3、4節)　、建て入れ直し、　ボルト本締め、デッキ張り、スタッド打	5／8大ホール舞台すのこ組立　5／18～　④工区練習室鉄骨建方
左官工事	地下1、2階各所左官補修	地下1・2階、地上1階各所左官補修	地上1・2階各所左官補修
防水工事		二重壁溝防水、消火・雑用水槽防水	
金属工事	1階　間仕切スミ出し、軽鉄壁下地組	1階　軽鉄壁下地組	1階　軽鉄壁・天井下地組　5／15～　2階間仕切スミ出し、　軽鉄壁下地組
内外装工事	機械室基礎部防塵塗装　1階　壁ボード張り	1階　壁ボード張り、発泡ウレタン吹付	1階　壁ボード張り、発泡ウレタン吹付
金属製建具工事	B2階　SD枠建付	地下1・2階シャッター建付　1階　AW枠建付、SD枠建付	1階　AW枠建付、SD枠、シャッター建付
鉄骨工事(耐火被覆・塗装)		1階　耐火塗装、ロックウール吹付	1階　耐火塗装、ロックウール吹付
金属工事(HPC工事)			2階　首里織HPC取付
塗装工事(HPC工事)			2階　パラペット塗装
はつり・振動作業		8:00～18:00　コンクリート整形時のはつり・振動作業	
鉄骨建方(トレーラー・トラック)		7:00～18:00　搬入トレーラーの出入りはNo1.2.5ゲート使用	
生コン打設(ミキサー車)		8:00～18:00　ミキサー車の出入りはNo.1.2.5ゲート使用	
備考	第14回安全大会 店社パトロール 第64回定例会議 第65回定例会議 第66回定例会議 春分の日 第16回安衛協 第67回定例会議	第15回安全大会 第68回定例会議 店社パトロール 第69回定例会議 第70回定例会議 第71回定例会議 第17回安衛協 昭和の日	第72回定例会議 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 振替休日 第16回安全大会 第73回定例会議 店社パトロール 第74回定例会議 第75回定例会議 第18回安衛協 第76回定例会議

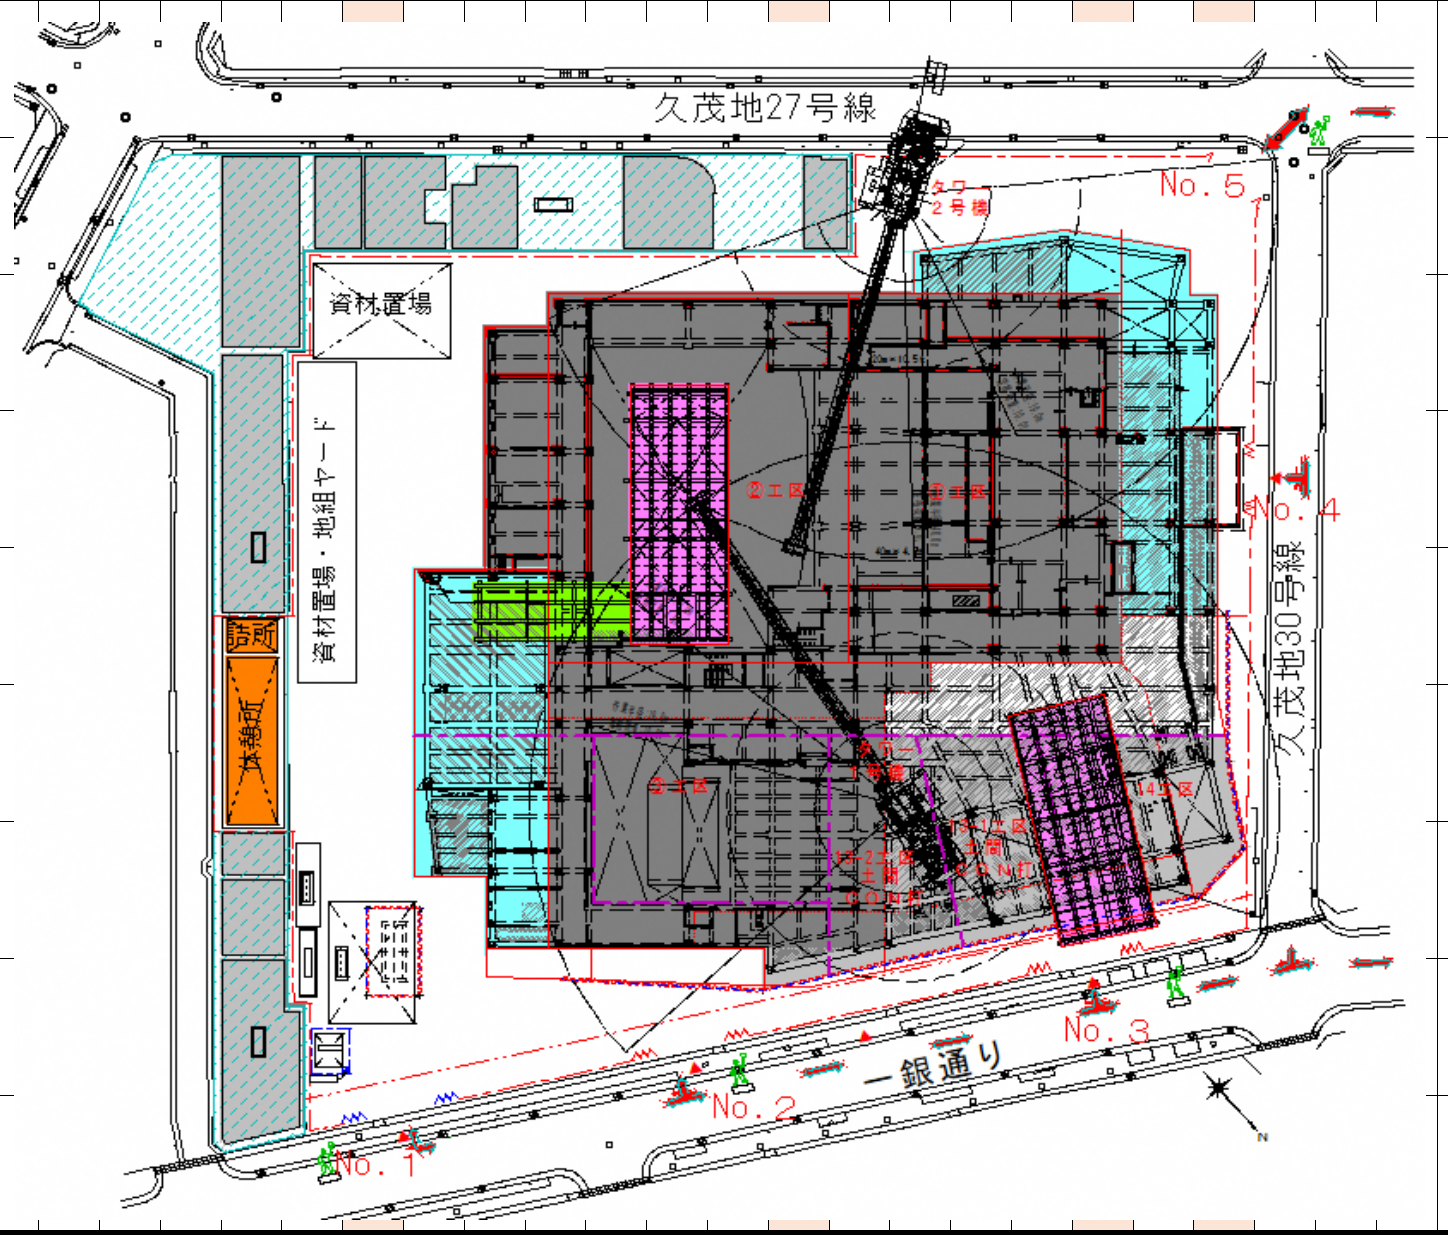

※4月度も揚重機作業、生コン打設作業に伴い、騒音・振動が発生致します。
　ご協力お願い致します。
※4月度も、工程によって日曜日に作業を行う場合があります。
　基本的には、騒音にならない程度の作業を予定しています。
　日曜作業をする場合は、その都度、作業内容等をご連絡致します。
お問い合わせ：那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築)
　國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体
　☎：098-917-0170
