2020年　1月　～　2020年　3月　3カ月工程表

工事名	那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（建築）	施工者	國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体	工期	自　2018年10月4日 至　2021年3月23日

1月
日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

2月
日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

3月
日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

月	1月	2月	3月
書類・施工図作成	平面詳細図、天井伏せ図修正・5階躯体図作成	平面詳細図、天井伏せ図修正・6階躯体図作成	平面詳細図、天井伏せ図修正・6階躯体図作成
共通仮設工事	12/29 ～ 1/5 年末年始休み		
立会検査	配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査	配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査	配筋、圧接UT、生コン受入、鉄骨建入れ検査
直接仮設工事	鉄骨建方工事に合わせて内外部足場組立	鉄骨建方工事に合わせて内外部足場組立	鉄骨建方工事に合わせて内外部足場組立
山留工事	14工区⇒13-1工区		
掘削・埋戻工事	13-1、14工区埋戻し		
鉄筋工事	1階柱・壁配筋　2階梁配筋	1階柱・壁配筋　2、3階梁配筋	2階柱・壁配筋　3、4階梁配筋
型枠工事	1階柱・壁型枠建込み・2階スラブ掛け	1階柱・壁型枠建込み・2階スラブ掛け	2階柱・壁型枠建込み・3階スラブ掛け
コンクリート工事	14工区土間 1階躯体 13-1工区土間 10-2、13-2工区スラブ 1階躯体 13-1、14工区スラブ	1階躯体 1階躯体 1階躯体 1階躯体 1階躯体 1階躯体 1階躯体 1階躯体	1階躯体 1階躯体 2階躯体 2階躯体 1階躯体 1階躯体 2階躯体 2階躯体
鉄骨工事（建方・本締め）	⑥⑩工区鉄骨建方（1節）、建て入れ直し、ボルト本締め　1／22　①②③⑥⑦⑧⑩工区	鉄骨建方（2節）、建て入れ直し、ボルト本締め、デッキ張り、スタッド打	3／16　①②③工区鉄骨建方（3、4節）、ボルト本締め
左官工事	ピット内左官補修	ピット内左官補修	地上階各所左官補修
防水工事		防火・消火・雑用水槽、二重壁溝防水	
オイルタンク工事	1／10底版コン　鉄筋・型枠工事　1／17壁コン　オイルタンク設置　タンク廻り埋戻し	2／4スラブコン　上部埋戻し、シートパイル引抜	
金属工事		2／3　B2階　二重壁下地組	B1階　二重壁下地組
内外装工事		2／10　B2階　二重ケイカル板張り、グラスウールボード貼り、機械室基礎防塵塗装	B1階　二重ケイカル板張り、グラスウールボード貼り
金属製建具工事		2／17　B2階　SD枠建付	B1階　SD枠建付

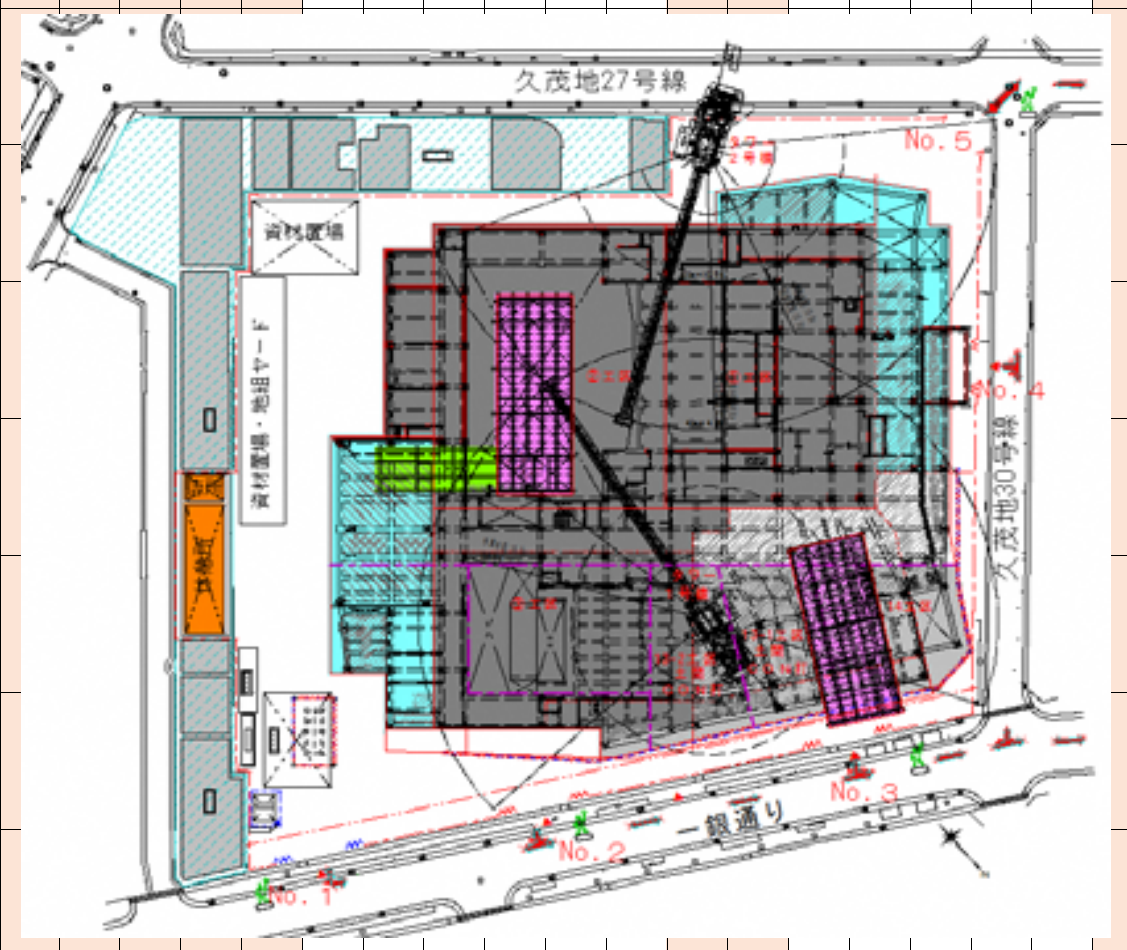

※2月度も重機作業、生コン打設作業に伴い、騒音・振動が発生致します。
　ご協力お願い致します。
※2月度も、工程によって日曜日に作業を行う場合があります。
　基本的には、騒音にならない程度の作業を予定しています。
　日曜作業をする場合は、その都度、作業内容等をご連絡致します。
お問い合わせ：那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（建築）
　國場組・大米建設・金城キク建設・ニシダ工業　共同企業体
　☎：098-917-0170

騒音・振動作業（大型10tダンプ）	8：00～18：00	埋戻し作業時に、石等にあたる音、転圧機械の音、はつり作業
鉄骨建方（トレーラー・トラック）	7：00～18：00	搬入トレーラーの出入りはNo1.2.5ゲート使用
生コン打設（ミキサー車）	8：00～18：00	ミキサー車の出入りはNo.1.2.5ゲート使用

備考

日付	備考
1月1日	元日
1月6日	第12回安全大会
1月10日	第56回定例会議
1月13日	成人の日
1月17日	第57回定例会議
1月24日	第58回定例会議
1月29日	第14回安衛協
1月31日	第59回定例会議
2月3日	第13回安全大会
2月5日	店社パトロール
2月7日	第60回定例会議
2月11日	建国記念日
2月14日	第61回定例会議
2月21日	第62回定例会議
2月23日	天皇誕生日
2月24日	振替休日
2月26日	第15回安衛協
2月28日	第63回定例会議
3月2日	第14回安全大会
3月4日	店社パトロール
3月6日	第64回定例会議
3月13日	第65回定例会議
3月19日	第66回定例会議
3月20日	春分の日
3月25日	第16回安衛協
3月27日	第67回定例会議
